[dossiê em construção]

Fase MVP Banco Brasileiro de Soluções de IA v.02

📋 Resumo do MVP (Q1/2026)

Segundo o documento do Escopo, a Fase 2 - MVP Dinâmico deve entregar:

- Backend mínimo
- Busca básica
- Login gov.br

🎯 Planejamento Estratégico

Estrutura do Time & Alocação de Papéis

Papel	Responsabilidade Principal	Alocação Fase 2
Coordenador Geral	Arquitetura, decisões técnicas, stakeholder management	60% técnico / 40% gestão
Gestor de Projeto	Product Owner, priorização, documentação, governança	80% projeto / 20% testes
Desenvolvedor Backend	APIs, integrações, lógica de negócio	100% desenvolvimento
DBA	Modelagem, PostgreSQL/MongoDB, Elasticsearch	70% banco / 30% DevOps
Infra	Kubernetes, CI/CD, segurança, gov.br	100% infraestrutura

🗓️ Cronograma de 12 Semanas (Q1/2026)

Sprint 0: Preparação (Semanas 1-2)

Objetivo: Alinhamento técnico e ambiente base

Atividade	Responsável	Entregável
Setup do ambiente Kubernetes na Nuvem Soberana (Ibict)	Infra	Cluster k8s funcional
Definição da arquitetura mínima (API Gateway + 3 microsserviços)	Coordenador	Documento de arquitetura
Modelagem inicial do banco (entidades Solution, User, Audit)	DBA	Schema v1
Especificação da API REST (OpenAPI/Swagger)	Gestor + Backend	Contrato de API

Integração Login Único gov.br (ambiente de homologação)	Infra + Backend	Autenticação funcionando

Marco: Ambiente de desenvolvimento pronto

Sprint 1: Fundação (Semanas 3-4)

Objetivo: Backend core e persistência

```
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ CATÁLOGO SERVICE (Node.js/NestJS)           │
│  - CRUD de Soluções                         │
│  - Metadados estruturados                   │
│  - Versionamento básico                     │
└─────────────────────────────────────────────┘
                      │
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ BANCO DE DADOS                              │
│ - PostgreSQL: dados estruturados            │
│  - MongoDB: metadados flexíveis             │
│  - Elasticsearch: índice de busca           │
└─────────────────────────────────────────────┘
```

Atividade	Responsável
Implementação do Catalog Service (CRUD completo)	Backend
Setup PostgreSQL + MongoDB com replicação	DBA
Pipeline CI/CD básico (build, test, deploy)	Infra
Configuração de logging centralizado (ELK)	Infra + DBA

Marco: API de catálogo funcionando localmente

Sprint 2: Busca e Descoberta (Semanas 5-6)

Objetivo: Motor de busca funcional

Atividade	Responsável
Integração Elasticsearch para full-text search	DBA + Backend
Implementação de filtros básicos (tema, tipo, órgão)	Backend
API de busca com paginação e ordenação	Backend
Cache Redis para queries frequentes	DBA

Endpoints entregues:
GET /api/v1/solutions?search=chatbot&theme=saude

GET /api/v1/solutions/{id}
POST /api/v1/solutions (protegido)
GET /api/v1/filters/options (facet counts)
Marco: Busca retornando resultados em <500ms

Sprint 3: Autenticação e Segurança (Semanas 7-8)

Objetivo: Login gov.br e autorização

Atividade	Responsável
Integração OIDC com Login Único gov.br	Infra + Backend
Implementação RBAC (usuário, curador, admin)	Backend
Middleware de autorização nos endpoints	Backend
Configuração WAF e rate limiting	Infra
Auditoria de acessos (tabela de logs)	DBA

Fluxo implementado:
[Cidadão] → [gov.br] → [Callback API] → [JWT Token] → [Acesso Portal]
Marco: Login funcional em ambiente de homologação

Sprint 4: Frontend Essencial (Semanas 9-10)

Objetivo: Interface mínima funcional

Decisão estratégica: Usar template baseado no protótipo do documento (página 22 e 26) para acelerar

Atividade	Responsável
Setup React + Tailwind + GovBR DS	Coordenador (review) + alocar dev frontend?
Alternativa enxuta: Usar Next.js com SSR para simplificar	Backend pode assumir
Tela de busca com filtros laterais	Backend (Next.js)
Card de solução (componente reutilizável)	Backend (Next.js)
Tela de detalhes da solução	Backend (Next.js)
Integração com API de catálogo	Backend

Componentes implementados:
- SolutionCard (título, órgão, tags, métricas)
- SearchFilters (checkboxes por categoria)
- SolutionDetail (metadados + link repositório)

Marco: Frontend consumindo API real

Sprint 5: Integração e Qualidade (Semanas 11-12)

Objetivo: End-to-end e preparação para produção

Atividade	Responsável
Testes de integração (busca + filtros + login)	Gestor + todos
Otimização de queries e índices	DBA
Documentação técnica (deploy, API)	Gestor
Configuração de monitoramento (Prometheus/Grafana)	Infra
Deploy em ambiente de staging	Infra
Validação com 2 órgãos pilotos (INSS, Receita)	Coordenador + Gestor

Checklist de entrega Fase 2:

- ☐ Busca textual funcionando
- ☐ Filtros por: capacidade técnica, tema, órgão, maturidade
- ☐ Login gov.br operacional
- ☐ Cadastro de 10+ soluções reais
- ☐ Tempo de resposta <2s
- ☐ Uptime 99.5% em staging

🏗️ Arquitetura Mínima Viável (Fase 2)

```
┌─────────────────────────────┐
│  CDN + WAF                  │
└─────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌─────────────────────────────┐
│  Load Balancer              │
└─────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌─────────────────────────────┐
│ Next.js (SSR)  │ ← Backend também faz frontend
│                │   - Páginas
│                │   - API Routes
└─────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌─────────────────────────────┐
│  API Gateway │
│  - Auth (JWT)               │
│  - Rate limit               │
└─────────────────────────────┘
                │
                ┌─────────┐
                ▼         ▼
┌──────────┐  ┌──────────────────
```

```
│Catalog │ │  Search  │
│Service │ │  Service │
│(NestJS)│ │(Elasticsearch)│
└────┬────┘ └──────────┬──────────┘
     │                 │
     ┌─────────────────┴─────────────────┐
     │  PostgreSQL + Redis  │
     │  MongoDB (metadados) │
     └───────────────────────────────────┘
```

📊 Gestão de Riscos

Risco	Mitigação
Sobrecarga do backend	Coordenador pair programar nas sprints críticas; usar boilerplates
Falta de frontend dedicado	Usar Next.js (backend pode fazer); componentes do GovBR DS prontos
Complexidade gov.br	Iniciar integração na Sprint 0; ter fallback manual
Elasticsearch instável	DBA focar em índices simples; ter busca PostgreSQL como backup
Prazo apertado	MVP radical: sem "submeter solução" (só curadoria manual), sem notificações

🎯 Definição de "Pronto" para Fase 2

Menos é mais: Funcionalidade completa > Funcionalidades pela metade

INcluir:

- Busca com filtros essenciais (3 dimensões do documento: técnica, governamental, temática)
- Visualização de soluções cadastradas
- Login gov.br
- 10 soluções reais catalogadas

EXcluir (para Fase 3):

- Submissão de novas soluções pelo portal (fazer via formulário + curadoria manual)
- Sistema de comunidade/forums
- Notificações em tempo real
- Trilhas de capacitação integradas
- Métricas avançadas de impacto

📈 Métricas de Sucesso da Fase 2

KPI	Meta	Como medir
Tempo médio de busca	<2 segundos	Grafana
Disponibilidade	99.5%	Uptime monitor
Usuários ativos (teste)	50 servidores	Analytics
Soluções catalogadas	10+	Count no banco
Satisfação (teste interno)	>4.0/5	Formulário ENAP

🚀 **Próximos Passos Imediatos**

1. Semana 0: Reunião de kickoff com todos - alinhar expectativas e decisões arquiteturais
2. Infra: Solicitar acesso à Nuvem Soberana (Ibict Cloud) e ambiente gov.br homologação
3. Gestor: Priorizar quais 10 soluções serão catalogadas primeiro (sugestão: INSS chatbot, Receita fiscalização, etc.)
4. Coordenador: Definir se usamos NestJS (documento sugere) ou framework (FastAPI + Next.js)

—-----

📅 **Cronograma Adaptado: 17 Semanas (16 Fev - 16 Jun 2026)**

FASE 1: PREPARAÇÃO E ARQUITETURA (Semanas 1-3)

16 Fev - 8 Mar

Semana	Atividades	Responsável	Entregável
1 (16-22 Fev)	Kickoff interno; Setup ambientes (Git, Jira); Mapeamento de 20 soluções prioritárias (INSS, Receita, etc.)	Todos / Gestor	Repositórios configurados; Planilha de 20 soluções
2 (23 Fev-1 Mar)	Definição arquitetura mínima; Setup Kubernetes Ibict Cloud; Modelagem banco v1	Coordenador + Infra	Documento arquitetura; Cluster k8s básico

3 (28 Mar)	Especificação API (3 endpoints: listar, buscar, detalhar); Revisão jurídica/LGPD básica; Login gov.br (homologação)	Backend + Gestor	Contrato API; Ambiente gov.br configurado

Marco M1: Arquitetura aprovada + 20 soluções mapeadas (8 Mar)

FASE 2: DESENVOLVIMENTO CORE (Semanas 4-9)

9 Mar - 19 Abr

Semana	Atividades	Responsável
4 (9-15 Mar)	Backend: Catalog Service (CRUD soluções); Banco: PostgreSQL + MongoDB	Backend + DBA
5 (16-22 Mar)	Backend: API de busca básica (PostgreSQL full-text); Infra: CI/CD pipeline	Backend + Infra
6 (23-29 Mar)	Frontend: Setup Next.js + GovBR DS; Páginas: Home, Busca, Detalhe	Coordenador (frontend)
7 (30 Mar-5 Abr)	Integração: Frontend consumindo API; Filtros básicos (tema, órgão, tipo)	Backend + Coordenador
8 (6-12 Abr)	Elasticsearch: Índice simples para busca full-text; Cache Redis	DBA + Backend
9 (13-19 Abr)	Login gov.br integrado; Autorização básica (usuário/admin); Testes internos	Infra + Backend

Marco M2: Portal funcional em homologação (19 Abr)

FASE 3: CONTEÚDO E CURADORIA (Semanas 10-12)

20 Abr - 10 Mai

Semana	Atividades	Responsável
10 (20-26 Abr)	Estruturação metadados 20 soluções; Validação com 5 órgãos (e-mail/Teams)	Gestor
11 (27 Abr-3 Mai)	Redação descrições técnicas; Páginas institucionais (Sobre, FAQ 20 perguntas)	Gestor + Coordenador
12 (4-10 Mai)	Inserção dados no portal; 2 vídeos tutoriais (screen capture simples); Glossário básico (50 termos)	Gestor + todos

Marco M3: 20 soluções publicadas + conteúdo mínimo (10 Mai)

FASE 4: TESTES E QUALIDADE (Semanas 13-14)

11 Mai - 24 Mai

Semana	Atividades	Responsável
13 (11-17 Mai)	Testes funcionais; Testes e-MAG (checklist automatizado aXe); Correções	Todos
14 (18-24 Mai)	Testes usabilidade remoto (15 servidores); Scan OWASP ZAP; Performance Lighthouse	Gestor + Infra

Marco M4: Portal validado (score e-MAG ≥95%, Lighthouse ≥90) (24 Mai)

FASE 5: PRODUÇÃO E LANÇAMENTO (Semanas 15-17)

25 Mai - 16 Jun

Semana	Atividades	Responsável
15 (25-31 Mai)	Deploy produção; Monitoramento (Prometheus/Grafana básico); Treinamento 5 curadores (remoto)	Infra + Gestor
16 (1-7 Jun)	Lançamento "soft" (comunicado interno MGI); Coleta feedback inicial; Hotfixes	Todos
17 (8-16 Jun)	Ajustes finais; Documentação técnica mínima (50 páginas); Relatório de lições aprendidas; Planejamento Fase 2	Gestor + Coordenador

Marco M5: Portal público + documentação (16 Jun)

🏗️ Arquitetura Mínima Viável

```
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  CDN + WAF (Cloudflare/Ibict)               │
└─────────────────────────────────────────────┘
                    │
                    ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Next.js (Frontend + API Routes)             │ ← Coordenador + Backend
│   - SSR para performance                    │
│   - API interna simplificada                │
└─────────────────────────────────────────────┘
                    │
                    ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  API Gateway (Kong/Nginx)                   │ ← Infra
│    - Rate limiting básico                   │
│    - Auth JWT (gov.br)                      │
└─────────────────────────────────────────────┘
                    │
                    ┴
                ┌───┴───┐
                ▼       ▼
```

```
┌──────────────┐        ┌──────────────────┐
│ PostgreSQL │        │ Elasticsearch │
│ (dados)    │        │ (busca simples) │
└──────────────┘        └──────────────────┘
                              │
                              ▼
                     ┌──────────────────┐
                     │ MongoDB          │
                     │ (metadados)      │
                     └──────────────────┘
```

Simplificações para equipe enxuta:

- Usar Next.js para unificar frontend e backend (menos context switching)
- Elasticsearch apenas para busca full-text (não facets complexos)
- Autenticação gov.br via biblioteca própria (não custom)
- Dados em JSON estático para 20 soluções (não precisa CMS)

📊 Métricas de Sucesso Adaptadas

Indicador	Meta Original	Meta Adaptada (Equipe Enxuta)
Soluções catalogadas	50-70	20
Órgãos contribuintes	10	5
Score e-MAG	≥98%	≥95%
Lighthouse Performance	≥95	≥90
Usuários teste	40	15
Vídeos tutoriais	8	2
Documentação	150 págs	50 págs
API endpoints	5+	3

⚠ Gestão de Riscos Específica (Equipe Enxuta)

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Sobrecarga do backend (único dev)	Alta	Alto	Coordenador pair programming 4h/semana; usar boilerplates NestJS
Falta de frontend dedicado	Alta	Médio	Usar templates GovBR DS prontos; não criar componentes custom
Atraso na curadoria (gestor sobrecarregado)	Média	Alto	Limitar a 20 soluções; usar metadados existentes dos órgãos

Elasticsearch complexo	Média	Médio	Usar PostgreSQL full-text como fallback; DBA focar em índices simples
Login gov.br instável	Média	Alto	Ter autenticação alternativa (usuário/senha interno) para homologação
Férias/afastamentos (5 pessoas = 20% da equipe)	Média	Alto	Documentação contínua; nenhuma tarefa "siloed"

📋 Checklist de Entrega (16 Jun 2026)

Funcionalidades Obrigatórias:

- ☐ Busca textual em 20 soluções
- ☐ Filtros: por órgão, tema (saúde, educação, etc.), tipo de IA (PLN, visão computacional)
- ☐ Página de detalhe da solução (metadados + link repositório)
- ☐ Login gov.br funcionando
- ☐ 20 soluções reais catalogadas (INSS, Receita, etc.)
- ☐ Score e-MAG ≥95%
- ☐ URL pública .gov.br

NÃO incluir (para Fase 2):

- Submissão de novas soluções pelo portal (fazer via e-mail)
- Sistema de comunidade/forums
- Notificações em tempo real
- Trilhas de capacitação integradas
- API pública documentada (usar internamente)
- Evento de lançamento presencial

🚀 Próximos Passos Imediatos (Próxima Semana)

1. Coordenador: Validar arquitetura simplificada (Next.js + PostgreSQL) com CIIA/IBICT
2. Gestor: Selecionar 20 soluções prioritárias (sugestão: 5 INSS, 5 Receita, 3 Dataprev, 3 ANA, 2 ANVISA, 2 outros)
3. Infra: Solicitar acesso Ibict Cloud e ambiente gov.br homologação

4. Backend: Criar repositório e setup inicial NestJS
5. Todos: Daily standup 15min (manhã) para sincronização dada a equipe enxuta

📈 **Transição para Fase 2 (Jul-Set 2026)**
O que a Fase 1 entrega para a Fase 2:

- Base de código: Next.js estruturado, pronto para escalar
- Processo de curadoria: Documentado e testado com 20 soluções
- Infraestrutura: Kubernetes configurado na Ibict Cloud
- Relacionamento: 5 órgãos engajados e prontos para contribuir mais

A Fase 2 (com equipe potencialmente expandida) adicionaria: backend dedicado, sistema de submissão, comunidade, mais soluções.

PLANO DE TRABALHO - FASE 1 (MVP)

Portal do Banco de Soluções de Inteligência Artificial do Governo Federal

Versão: 2.0 - Equipe Enxuta
Período: 16 de Fevereiro a 16 de Junho de 2026 (17 semanas)

1. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Descrição
Título do Projeto	Portal do Banco de Soluções de IA - Fase 1 (MVP)
Órgão Executor	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
Unidade Responsável	Laboratório de Inovação em Inteligência Artificial - LIIA/ENAP
Unidade Co-executora	Centro de Inovação em Inteligência Artificial - CIIA/IBICT
Coordenador do Projeto	[Nome do Coordenador - LIIA]
Gestor Técnico	[Nome do Gestor Técnico - CIIA]
Data de Início	16/02/2026
Data de Término	16/06/2026
Valor Total Estimado	R$ 180.000,00
Fonte de Recursos	Orçamento MGI - Ação [número]

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Contextualização

O Brasil adotou em 2024 o Marco Legal da Inteligência Artificial (Lei nº 14.918/2024) e estabeleceu o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA (2024-2028). O Eixo 3 do PBIA - "Aplicação no Setor Público" - identifica como desafio crítico a fragmentação de iniciativas, duplicação de esforços e ausência de mecanismos estruturados de compartilhamento de conhecimento entre órgãos da Administração Pública Federal.

2.2. Problema a Ser Resolvido

Como centralizar e deO Brasil adotou em 2024 o Marco Legal da Inteligência Artificial (Lei nº 14.918/2024) e
estabeleceu o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA (2024-2028). O Eixo 3 do PBIA - "Aplicação no Setor Público" - identifica como desafio crítico a fragmentação de iniciativas, duplicação de esforços e ausência de mecanismos estruturados de compartilhamento de conhecimento entre órgãos da Administração Pública Federal.

2.2. Problema a Ser Resolvido

Como centralizar e democratizar o acesso a soluções de IA validadas e reutilizáveis, promovendo eficiência, economia e soberania tecnológica no setor público, com recursos humanos limitados.

2.3. Alinhamento Estratégico

Instrumento	Alinhamento
PBIA 2024-2028	Eixo 3 - Aplicação no Setor Público
PPA 2024-2027	Objetivo 1131 - Aprimorar a gestão pública com foco na eficiência
Estratégia de Governo Digital (EGD)	Eixo: Inovação e Tecnologias Emergentes
IN SGD/MGI nº 01/2022	Priorização de Software Livre e Código Aberto
Decreto nº 10.332/2020	Estratégia de Governo Digital

2.4. Benefícios Esperados (MVP)

Democratizar o acesso a soluções de IA validadas e reutilizáveis, promovendo eficiência, economia e soberania tecnológica no setor público, com recursos humanos limitados.

2.3. Alinhamento Estratégico

Instrumento	Alinhamento
PBIA 2024-2028	Eixo 3 - Aplicação no Setor Público

PPA 2024-2027	Objetivo 1131 - Aprimorar a gestão pública com foco na eficiência
Estratégia de Governo Digital (EGD)	Eixo: Inovação e Tecnologias Emergentes
IN SGD/MGI nº 01/2022	Priorização de Software Livre e Código Aberto
Decreto nº 10.332/2020	Estratégia de Governo Digital

2.4. Benefícios Esperados (MVP)

1. Validação do Conceito: Demonstrar viabilidade técnica e institucional do portal
2. Base para Escala: Arquitetura preparada para crescimento na Fase 2
3. Economia Inicial: R$ 5 milhões em potencial de reuso (20 soluções × R$ 250k média)
4. Conformidade: 100% de aderência a LGPD, e-MAG e Marco Legal da IA
5. Capacitação: Equipe interna qualificada para evolução do projeto

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver e implantar a Fase 1 (MVP) do Portal do Banco de Soluções de IA, estabelecendo um repositório centralizado, acessível e governado de 20 soluções de IA reutilizáveis para a Administração Pública Federal, com equipe enxuta de 5 pessoas e prazo de 17 semanas.

3.2. Objetivos Específicos

1. Catalogar 20 soluções de IA já implementadas e validadas em órgãos federais
2. Desenvolver interface web responsiva e acessível (conformidade e-MAG ≥95%)
3. Implementar sistema de classificação multidimensional simplificado (técnico + temático)
4. Estabelecer fluxo de curadoria manual e validação de soluções
5. Validar usabilidade com 15 servidores de pelo menos 5 órgãos federais
6. Garantir 100% de conformidade com LGPD, e-MAG e diretrizes de segurança
7. Criar documentação técnica mínima (50 páginas) para suporte à Fase 2
8. Estabelecer métricas de monitoramento básicas
9. Treinar 5 pessoas (equipe + 2 curadores) para operação
10. Realizar lançamento virtual (sem evento presencial)
11. Desenvolver API interna para integração futura (3 endpoints)
12. Preparar planejamento detalhado da Fase 2 (expansão)

4. METAS

#	Meta	Indicador	Valor	Prazo
1	Soluções catalogadas	Nº de soluções com metadados completos	20	Semana 12 (10/05/26)

2	Órgãos contribuintes	Nº de órgãos com soluções validadas	5	Semana 11 (03/05/26)
3	Portal em produção	URL pública funcional	1	Semana 15 (01/06/26)
4	Conformidade de acessibilidade	Score e-MAG	≥ 95%	Semana 14 (24/05/26)
5	Performance do portal	Lighthouse Performance Score	≥ 90	Semana 14 (24/05/26)
6	Validação com usuários	Testes de usabilidade realizados	15 usuários	Semanas 6, 10, 14
7	Satisfação dos usuários	Net Promoter Score (NPS)	≥ 60	Semana 17 (16/06/26)
8	Documentação técnica	Documentos entregues	3	Semana 17 (16/06/26)
9	Acessos únicos pós-lançamento	Usuários únicos (primeira semana)	≥ 100	Semana 16 (08/06/26)
10	Vulnerabilidades de segurança	Vulnerabilidades críticas identificadas	0	Semana 14 (24/05/26)
11	Equipe capacitada	Pessoas treinadas	5	Semana 15 (01/06/26)
12	Material de capacitação	Vídeos tutoriais produzidos	2	Semana 12 (10/05/26)
13	Cobertura de testes	% funcionalidades testadas	≥ 85%	Semana 14 (24/05/26)
14	Submissões de novas soluções	Formulários recebidos pós-lançamento	≥ 5	Semana 17 (16/06/26)
15	Alcance da campanha	Impressões em mídias sociais	≥ 10.000	Semana 16 (08/06/26)

5. EQUIPE ESTRUTURA

5.1. Composição da Equipe

Nome	Função	Carga Horária	Principais Responsabilidades	Experiência Mínima
[Nome]	Coordenador Geral / Arquiteto	40h/s	Arquitetura de software, backend core, code review, gestão técnica, stakeholder management	10 anos em desenvolvimento, 5 em liderança técnica
[Nome]	Gestor de Projeto / Product Owner / Curador	40h/s	Priorização de backlog, curadoria de conteúdo, documentação, testes de usabilidade, comunicação com órgãos	6 anos em gestão de produtos digitais
[Nome]	Desenvolvedor Full Stack	40h/s	API REST, integrações, banco de dados, frontend quando necessário	7 anos em desenvolvimento web (Node.js, React)

[Nome]	DBA / DevOps / Infraestrutura	40h/s	PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Kubernetes, CI/CD, segurança, monitoramento	6 anos em infraestrutura cloud e bancos de dados
[Nome]	UX/UI Designer / Frontend Developer	40h/s	Interface do usuário, prototipação, implementação frontend, acessibilidade (e-MAG)	5 anos em design de interfaces e desenvolvimento frontend

6. METODOLOGIA

6.1. Abordagem Metodológica

O projeto adotará metodologia ágil enxuta, combinando:

- Kanban para gestão visual de tarefas (limitação de WIP por pessoa: 2 tarefas)
- Sprints de 1 semana (ciclos curtos para adaptação rápida)
- Daily standup 15 minutos (9h00) - obrigatório dada a equipe reduzida
- DevOps para integração e entrega contínua
- Pair programming semanal (4 horas) para mitigação de dependências individuais

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.1. Visão Geral das Etapas

Etapa	Atividades Principais	Início	Término	Duração	Responsável Líder
1	Preparação e Arquitetura	16/02/26	08/03/26	3 sem	Coordenador Geral
2	Desenvolvimento Core	09/03/26	19/04/26	6 sem	Dev Full Stack
3	Conteúdo e Curadoria	20/04/26	10/05/26	3 sem	Gestor de Projeto
4	Testes e Qualidade	11/05/26	24/05/26	2 sem	UX/UI Designer
5	Produção e Lançamento	25/05/26	16/06/26	3 sem	DBA/DevOps

7.2. Cronograma Detalhado por Semana

ETAPA 1: PREPARAÇÃO E ARQUITETURA (Semanas 1-3)

Semana 1 (16-22 Fev): Kickoff e Mapeamento

- Reunião de kickoff com equipe enxuta (alinhamento de expectativas)
- Setup de ferramentas: ClickUp, Whatsapp, GDrive
- Mapeamento de 20 soluções prioritárias em 5 órgãos (Judiciário, Receita Federal, Dataprev, ANVISA)
- Contato inicial com órgãos (e-mail formal solicitando metadados)
- Definição de arquitetura simplificada (Next.js + PostgreSQL + Elasticsearch)

Entregáveis: Repositórios configurados, planilha de 20 soluções, arquitetura preliminar
Semana 2 (23 Fev-1 Mar): Ambiente e Modelagem

- Setup Kubernetes na Ibict Cloud (Nuvem Soberana)
- Configuração de CI/CD básico (GitLab Actions)
- Modelagem do banco de dados v1 (entidades: Solution, User, Audit)
- Especificação da API (3 endpoints: GET /solutions, GET /solutions/:id, POST /search)
- Revisão de conformidade LGPD (checklist)

Entregáveis: Cluster k8s funcional, schema do banco, contrato de API
Semana 3 (2-8 Mar): Integrações Fundamentais

- Integração Login Único gov.br (ambiente de homologação)
- Setup PostgreSQL + MongoDB (metadados flexíveis)
- Configuração Elasticsearch básico (índice de busca)
- Validação de arquitetura com CIIA/IBICT

Marco M1 (8 Mar): Arquitetura aprovada + 20 soluções mapeadas + Ambiente pronto

ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO CORE (Semanas 4-9)

Semana 4 (9-15 Mar): Backend Fundacional

- Desenvolvimento Catalog Service (CRUD de soluções)
- Implementação de metadados estruturados (JSON Schema)
- Migração de dados das 20 soluções (JSON estático inicial)
- Testes unitários (Jest)

Responsável: Dev Full Stack (backend) + DBA (modelagem)
Semana 5 (16-22 Mar): API e Busca

- Desenvolvimento API REST (Node.js/NestJS ou Next.js API Routes)
- Implementação de busca básica (PostgreSQL full-text como fallback)
- Filtros simples: órgão, tema, tipo de IA
- Documentação Swagger/OpenAPI básica

Responsável: Dev Full Stack
Semana 6 (23-29 Mar): Frontend Base

- Setup Next.js 14 com App Router
- Integração Design System GovBR (DSGov)
- Implementação página Home (hero, busca, estatísticas)
- Testes de usabilidade #1 (5 usuários internos)

Responsável: UX/UI Designer + Dev Full Stack (apoio)
Semana 7 (30 Mar-5 Abr): Busca e Filtros

- Implementação página de resultados (grid de cards)
- Componente de filtros laterais (checkboxes)
- Integração frontend-backend (API real)
- Responsividade mobile (testes em 3 breakpoints)

Responsável: UX/UI Designer + Dev Full Stack
Semana 8 (6-12 Abr): Detalhes e Elasticsearch

- Página de detalhe da solução (metadados completos)
- Integração Elasticsearch (busca full-text otimizada)

- Cache Redis para queries frequentes
- Otimização de performance (lazy loading, code splitting)

Responsável: DBA (Elasticsearch) + Dev Full Stack + UX/UI Designer

Semana 9 (13-19 Abr): Autenticação e Integração

- Login gov.br integrado (fluxo completo)
- Autorização básica (roles: usuário, curador, admin)
- Painel administrativo simples (CRUD de soluções)
- Testes de integração end-to-end

Marco M2 (19 Abr): Portal funcional em homologação (busca, filtros, login, 20 soluções)

ETAPA 3: CONTEÚDO E CURADORIA (Semanas 10-12)

Semana 10 (20-26 Abr): Estruturação de Conteúdo

- Estruturação de metadados das 20 soluções (validação com órgãos)
- Redação de descrições técnicas (baseadas em documentos dos órgãos)
- Coleta de links para repositórios de código (GitLab Gov, GitLab)
- Validação de 5 órgãos (Teams/e-mail)

Responsável: Gestor de Projeto (100%)

Semana 11 (27 Abr-3 Mai): Páginas Institucionais

- Página "Sobre o Portal"
- FAQ (20 perguntas frequentes)
- Glossário de IA (50 termos essenciais)
- Página de contato/feedback

Responsável: Gestor de Projeto + UX/UI Designer (implementação)

Semana 12 (4-10 Mai): Finalização de Conteúdo

- Inserção das 20 soluções no banco de dados
- Produção de 2 vídeos tutoriais (screen capture + narração simples)
- Manual do curador (20 páginas, versão resumida)
- Revisão jurídica de textos (consultoria externa pontual se necessário)

Marco M3 (10 Mai): 20 soluções publicadas + conteúdo institucional completo

ETAPA 4: TESTES E QUALIDADE (Semanas 13-14)

Semana 13 (11-17 Mai): Testes Funcionais e Acessibilidade

- Testes funcionais completos (smoke, regression)
- Testes de acessibilidade e-MAG (ferramenta aXe + checklist manual)
- Testes cross-browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Correção de bugs críticos

Responsável: Todos (cada um testa área do outro) + Gestor de Projeto (coordenação)

Semana 14 (18-24 Mai): Validação e Segurança

- Testes de usabilidade #2 (10 servidores de 5 órgãos - remoto)
- Scan de segurança OWASP ZAP (automatizado)
- Testes de performance (Lighthouse, WebPageTest)
- Testes de carga básicos (100 usuários simultâneos simulados)
- Correções finais

Marco M4 (24 Mai): Portal validado (e-MAG ≥95%, Lighthouse ≥90, 0 vulnerabilidades críticas)

ETAPA 5: PRODUÇÃO E LANÇAMENTO (Semanas 15-17)

Semana 15 (25-31 Mai): Preparação para Produção

- Setup infraestrutura de produção (IBICT Cloud)
- Configuração de monitoramento (Prometheus + Grafana básico)
- Deploy em produção (go-live técnico)
- Treinamento da equipe (5 pessoas - 8 horas cada, remoto)
- Documentação técnica mínima (50 páginas: arquitetura, deploy, API)

Responsável: DBA/DevOps + Coordenador Geral (documentação)

Semana 16 (1-7 Jun): Lançamento Virtual

- Lançamento "soft" (comunicado interno MGI e 5 órgãos)
- Campanha em redes sociais gov (@GovDigitalBR, LinkedIn)
- Monitoramento intensivo (plantão técnico diário 2h)
- Coleta de feedback inicial (formulário online)
- Hotfixes emergenciais

Responsável: Gestor de Projeto (comunicação) + Todos (suporte técnico)

Semana 17 (8-16 Jun): Estabilização e Entrega

- Análise de métricas de uso (primeira semana)
- Cálculo de NPS (formulário de satisfação)
- Ajustes finais baseados em feedback
- Relatório de lições aprendidas (20 páginas)
- Planejamento detalhado da Fase 2 (escopo, equipe, cronograma)
- Entrega formal do projeto

Marco M5 (16 Jun): Portal público operacional + documentação + roadmap Fase 2

8. ARQUITETURA TÉCNICA SIMPLIFICADA

8.1. Diagrama de Arquitetura

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CDN (Cloudflare ou IBICT)                               │
│  - Cache estático                                       │
│  - WAF básico                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Next.js 14 (App Router)                                 │
│ ├── Frontend (React + GovBR DS)                         │
│ │   └── API Routes (Node.js)                            │
│ │        - /api/solutions                               │
│ │        - /api/search                                  │
│ │        - /api/auth (gov.br)                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```

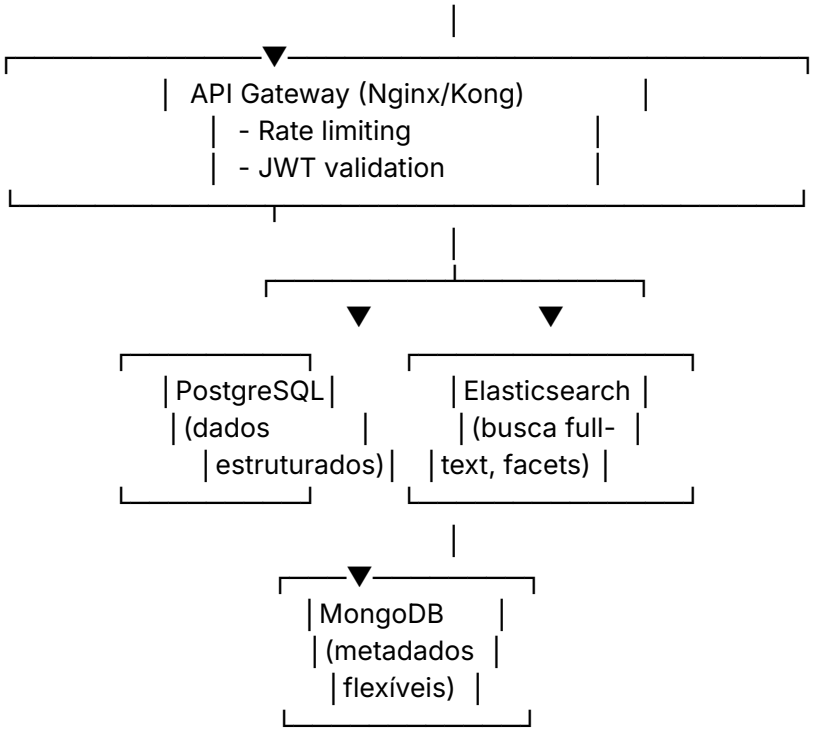

8.2. Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	Next.js 14 + React + TypeScript	SSR, performance, unificação frontend/backend
UI Components	GovBR DS (Design System)	Conformidade gov.br, acessibilidade pronta
Estilização	Tailwind CSS + Sass	Produtividade, manutenibilidade
Backend	Next.js API Routes + Node.js	Código unificado, menos context switching
Banco Relacional	PostgreSQL 15	Confiabilidade, full-text search nativo
Banco Documentos	MongoDB	Metadados flexíveis de soluções
Busca	Elasticsearch 8	Full-text avançado, agregações (facets)
Cache	Redis	Performance de queries frequentes
Auth	NextAuth.js + gov.br OIDC	Login único integrado
Infra	Kubernetes (IBICT Cloud)	Orquestração, escalabilidade futura
CI/CD	GitLab Actions	Automação de build e deploy
Monitoramento	Prometheus + Grafana	Métricas de infra e aplicação
Logs	ELK Stack (simplificado)	Centralização de logs

8.3. Modelo de Dados Essencial

```
// Entidade: Solution (Solução)
{
```

```
  "id": "uuid",
  "title": "Chatbot de Atendimento do INSS",
  "description": "Assistente virtual para...",
  "organization": {
        "name": "INSS",
        "acronym": "INSS",
        "unit": "Diretoria de Atendimento"
  },
  "status": "production", // proof-of-concept, pilot, production, scale
  "license": "MIT",
  "classification": {
        "technical": "pln", // pln, computer-vision, generative-ai, predictive
        "governmental": "atendimento", // planejamento, execucao, monitoramento,
avaliacao
        "thematic": "saude" // saude, educacao, seguranca, meio-ambiente, etc.
  },
  "metadata": {
        "techStack": ["Python", "Rasa", "Docker"],
        "metrics": {
        "users": 120000,
        "satisfaction": 4.2,
        "costSavings": "R$ 2.1M/ano"
        },
        "ethicalReview": true,
        "lgpdCompliant": true
  },
  "resources": {
        "repoUrl": "https://gitlab.gov.br/inss/chatbot",
        "docsUrl": "https://...",
        "demoUrl": "https://..."
  },
  "contact": {
        "name": "João Silva",
        "email": "joao.silva@inss.gov.br"
  },
  "createdAt": "2024-01-15",
  "updatedAt": "2025-10-15"
}
```


9. FLUXOS DE TRABALHO

9.1. Fluxo de Curadoria (Manual - MVP)

1. ÓRGÃO ENVIA SOLUÇÃO

↓ (e-mail para bancoia@enap.gov.br)

2. GESTOR DE PROJETO ANALISA
↓ (checklist de completude: metadados, código, docs)

3. REVISÃO TÉCNICA (Coordenador + Dev)
↓ (qualidade de código, documentação, conformidade)

4. REVISÃO ÉTICA/LGPD (Gestor + Consultoria pontual)
↓ (checklist de conformidade)

5. PUBLICAÇÃO NO PORTAL
↓ (inserção manual no banco de dados)

6. NOTIFICAÇÃO AO ÓRGÃO
↓ (e-mail de confirmação)

9.2. Fluxo de Busca e Reutilização

```
USUÁRIO ACESSA PORTAL
        ↓
┌──────────────────┐
│ HOME: Busca      │ ←── Campo de pesquisa + filtros rápidos
│ principal        │
└──────────┬───────┘
        ↓
┌──────────────────┐
│ RESULTADOS:      │ ←── Grid de cards com filtros laterais
│ Lista de        │       (órgão, tema, tipo, maturidade)
│ soluções        │
└──────────┬───────┘
        ↓
┌──────────────────┐
│ DETALHE:         │ ←── Metadados completos, métricas,
│ Ficha técnica   │     links para repositório, contato
└──────────┬───────┘
        ↓
  [Clonar/Reutilizar] → Redirecionamento para repositório Git
```

10. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO-FUNCIONAIS

10.1. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição	Prioridade	Responsável
RF-01	Buscar soluções por texto livre	Alta	Dev Full Stack

RF-02	Filtrar soluções por: órgão, tema, tipo de IA, maturidade	Alta	Dev Full Stack
RF-03	Visualizar detalhes completos da solução	Alta	UX/UI Designer
RF-04	Acessar repositório de código externo (link)	Média	UX/UI Designer
RF-05	Autenticar via Login Único gov.br	Alta	Dev Full Stack
RF-06	Cadastrar nova solução (admin/curador)	Média	Dev Full Stack
RF-07	Exportar metadados da solução (JSON)	Baixa	Dev Full Stack
RF-08	Visualizar estatísticas do portal (dashboard simples)	Baixa	UX/UI Designer

10.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Categoria	Requisito	Métrica	Verificação
Desempenho	Tempo de carregamento inicial	< 3s (4G)	Lighthouse
	Tempo de resposta da API	< 200ms	Prometheus
Escalabilidade	Usuários simultâneos	500	Teste de carga
Segurança	Criptografia em trânsito e repouso	TLS 1.3, AES-256	Scan SSL Labs
	Vulnerabilidades críticas	0	OWASP ZAP
Conformidade	e-MAG	≥ 95%	aXe + manual
	LGPD	100%	Checklist jurídico
Disponibilidade	Uptime	≥ 99%	Monitoramento
Manutenibilidade	Cobertura de testes	≥ 85%	Jest/Istanbul
	Documentação	50 páginas	Revisão

11. RISCOS E MEDIDAS MITIGADORAS

#	Risco	Prob.	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável	Contingência
R01	Sobrecarga do Dev Full Stack (único)	Alta	Alto	Pair programming semanal com Coordenador; uso de boilerplates; escopo congelado após S8	Coordenador	Reduzir funcionalidades não-críticas (export, dashboard)
R02	Atraso na curadoria (Gestor sobrecarregado)	Média	Alto	Limitar a 20 soluções; reusar metadados dos órgãos; não exigir formato perfeito	Gestor	Publicar com metadados mínimos e completar iterativamente

R03	Elasticsearch complexo para equipe	Média	Médio	Usar PostgreSQL full-text como MVP; Elasticsearch como "nice to have"	DBA	Desativar facets complexos, manter busca simples
R04	Login gov.br instável	Média	Alto	Implementar auth alternativa (usuário/senha interno) para homologação; testar desde S3	Dev Full Stack	Lançar sem gov.br (autenticação interna) e integrar depois
R05	Férias/afastamento (20% da equipe)	Média	Alto	Documentação contínua; nenhuma tarefa "siloed"; cross-training semanal	Todos	Redistribuir tarefas; priorizar entregas críticas
R06	Órgãos não respondem com metadados	Média	Alto	Contato formal desde S1; follow-up semanal; oferecer template pré-preenchido	Gestor	Usar dados públicos (portais, GitLab) sem validação formal
R07	Performance abaixo do esperado	Média	Médio	Testes de performance desde S8; otimização contínua; CDN desde início	DBA	Simplificar interface (menos elementos por página)

12. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E QUALIDADE

12.1. Definição de "Pronto" (Definition of Done)

Para cada funcionalidade:

- ☐ Código implementado e revisado (por outro membro da equipe)
- ☐ Testes unitários com cobertura ≥ 80%
- ☐ Testes de integração passando
- ☐ Documentação técnica atualizada
- ☐ Deploy em homologação funcionando
- ☐ Verificação de acessibilidade (aXe) sem erros críticos
- ☐ Aprovado pelo Gestor de Projeto (validação de negócio)

12.2. Checklist de Lançamento

- ☐ 20 soluções publicadas com metadados completos

- ☐ Busca funcionando (texto + filtros)
- ☐ Login gov.br operacional
- ☐ Score e-MAG ≥ 95% (validação externa)
- ☐ Lighthouse Performance ≥ 90
- ☐ 0 vulnerabilidades críticas (OWASP ZAP)
- ☐ Documentação técnica (50 páginas)
- ☐ 5 pessoas treinadas
- ☐ Monitoramento configurado
- ☐ URL pública .gov.br ativa

13. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

13.1. Comitê Gestor Simplificado

Nome	Órgão	Função	Participação
[Nome]	LIIA/ENAP	Presidente	Reuniões quinzenais (30 min)
[Nome]	CIIA/IBICT	Vice-Presidente Técnico	Reuniões quinzenais
[Nome]	SGD/MGI	Membro	Reuniões mensais
[Nome]	Órgão usuário (INSS/Receita)	Membro	Reuniões mensais

14.2. Rituais da Equipe Enxuta

Ritual	Frequência	Duração	Participantes	Objetivo
Daily Standup	Diária	15 min	Todos	Sincronização, bloqueios, prioridades
Planning	Segunda (manhã)	1h	Todos	Planejamento da semana, divisão de tarefas
Review	Sexta (tarde)	30 min	Todos	Demo do que foi feito, feedback rápido
Retrospectiva	Quinzenal	1h	Todos	Melhoria contínua do processo
Reunião Comitê	Quinzenal	30 min	Coordenador + Comitê	Alinhamento estratégico, desbloqueios

14.3. Canais de Comunicação

- Discord: Comunicação diária, integrações (GitLab, Jira)
- ClickUp: Gestão de tarefas, acompanhamento de progresso
- Google Drive/SharePoint: Documentação, atas, relatórios
- GitLab: Código, issues técnicas, documentação técnica
- E-mail formal: Comunicação com órgãos externos, Comitê Gestor

15. ENTREGÁVEIS DO PROJETO

15.1. Entregáveis Técnicos

#	Entregável	Descrição	Responsável	Prazo
1	Código-fonte	Repositório GitLab público (licença MIT)	Todos	Contínuo
2	Documentação técnica	Arquitetura, deploy, API (50 páginas)	Coordenador	16/06/26
3	Documentação de usuário	FAQ, glossário, guia de uso (20 páginas)	Gestor	16/06/26
4	Manual do curador	Processo de curadoria (20 páginas)	Gestor	10/05/26
5	API documentada	Swagger/OpenAPI (3 endpoints)	Dev Full Stack	19/04/26
6	Relatório de testes	Funcionais, usabilidade, segurança	Todos	24/05/26
7	Relatório final	Lições aprendidas, métricas, roadmap Fase 2	Gestor	16/06/26

15.2. Entregáveis Institucionais

#	Entregável	Descrição	Prazo
1	Portal em produção	URL pública .gov.br funcional	01/06/26
2	20 soluções catalogadas	Metadados validados e publicados	10/05/26
3	5 órgãos engajados	Termos de adesão ou carta de compromisso	03/05/26
4	5 pessoas treinadas	Certificados de capacitação	01/06/26
5	2 vídeos tutoriais	Publicados no YouTube/portal	10/05/26
6	Planejamento Fase 2	Documento com escopo, equipe, cronograma	16/06/26

16. CRONOGRAMA VISUAL

```
FEVEREIRO     MARÇO         ABRIL           MAIO            JUNHO
16  23        2   9  16  23   30  6  13  20  27   4  11  18  25   1   8  16
|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————
————————————|————————————|
|  ETAPA 1: PREPARAÇÃO E ARQUITETURA (3 sem)  |
|  M1: Arquitetura aprovada + 20 soluções mapeadas                    |
          |  ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO CORE (6 sem)  |
          |  M2: Portal funcional em homologação                |
                          |  ETAPA 3: CONTEÚDO (3 sem)  |
                          |  M3: 20 soluções publicadas         |
                                          |  ETAPA 4: TESTES (2 sem)  |
```

```
                                        |  M4: Portal validado              |
                                                                  |  ETAPA 5: PRODUÇÃO (3 sem)  |
                                                                  |  M5: Portal público              |
```

---

17. APÊNDICES

Anexo I - Modelo de Metadados de Solução (JSON)

```
{
  "id": "uuid-v4",
  "title": "string (obrigatório, 3-100 chars)",
  "description": "string (obrigatório, 100-500 chars)",
  "organization": {
        "name": "string",
        "acronym": "string (3-10 chars)",
        "unit": "string"
  },
  "status": "enum: proof-of-concept | pilot | production | scale",
  "license": "enum: MIT | GPL-3.0 | Apache-2.0 | LGPL-3.0 | Other",
  "classification": {
        "technical": "enum: pln | computer-vision | generative-ai | predictive | rpa |
recommendation | other",
        "governmental": "enum: planejamento | execucao | monitoramento | avaliacao |
atendimento",
        "thematic": "enum: saude | educacao | seguranca | meio-ambiente |
assistencia-social | infraestrutura | gestao-fiscal | transformacao-digital |
desenvolvimento-economico"
  },
  "metadata": {
        "techStack": ["array", "of", "strings"],
        "developmentDate": "date",
        "lastUpdate": "date",
        "version": "string",
   "metrics": {
        "users": "number",
        "satisfaction": "number (0-5)",
        "costSavings": "string",
        "timeReduction": "string"
        },
        "ethicalReview": "boolean",
        "lgpdCompliant": "boolean",
        "riskLevel": "enum: low | medium | high"
  },
  "resources": {
```

```
        "repoUrl": "url",
        "docsUrl": "url",
        "demoUrl": "url",
        "apiUrl": "url"
  },
  "contact": {
        "name": "string",
        "email": "email",
        "phone": "string (opcional)"
  },
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp",
  "publishedBy": "uuid (user)",
  "publishedAt": "timestamp"
}
```

Anexo II - Checklist e-MAG Simplificado (MVP)

#	Critério	Verificação	Ferramenta
1	Contraste mínimo 4.5:1	Visual + automático	aXe, Lighthouse
2	Navegação por teclado	Teste manual	Tab, Enter, Esc
3	Alt text em imagens	Inspeção de código	aXe
4	Estrutura semântica HTML	Validação	W3C Validator
5	ARIA labels onde necessário	Inspeção	aXe
6	Foco visível	Teste manual	Navegação por teclado
7	Skip links	Teste manual	Tab inicial
8	Tamanho de toque 44×44px	Inspeção	DevTools
9	Zoom 200% sem perda	Teste manual	Ctrl + scroll
10	Leitor de tela	Teste com NVDA/VoiceOver	Leitura completa

Anexo III - Template de E-mail para Órgãos

Assunto: Convite para contribuir com o Banco de Soluções de IA - [Nome do Órgão]

Prezado(a) [Nome],

O Laboratório de Inovação em Inteligência Artificial (LIIA/ENAP), em parceria com o CIIA/IBICT, está desenvolvendo o Portal do Banco de Soluções de IA do Governo Federal.

Identificamos que o [Órgão] possui soluções de IA relevantes que poderiam beneficiar outros órgãos via reuso. Solicitamos sua contribuição com até 4 soluções para catalogação inicial.

Anexo: Template de metadados (Excel) - preenchimento estimado: 30 min/solução

Prazo: [Data - 2 semanas]

Apoio: Disponibilizamos webinar de 30 min para esclarecimentos (opcional).

Atenciosamente,
[Nome]
Gestor de Projeto - Banco de Soluções de IA
LIIA/ENAP

18. APROVAÇÃO

Este Plano de Trabalho foi elaborado em conformidade com as normas vigentes e submetido à aprovação das instâncias competentes.

Elaboração

Nome	Cargo/Função	Data	Assinatura
Eunice Liu	Coordenador do Projeto - LIIA/ENAP	____/____/2026	_____
[Nome Completo]	Gestor Técnico - CIIA/IBICT	____/____/2026	_____

Aprovação Técnica

Nome	Cargo/Função	Data	Assinatura
[Nome Completo]	Diretor do LIIA/ENAP	____/____/2026	_____
[Nome Completo]	Diretor do CIIA/IBICT	____/____/2026	_____

Aprovação Orçamentária

Nome	Cargo/Função	Data	Assinatura
[Nome Completo]	Coordenador-Geral de Orçamento - MGI	____/____/2026	_____

Aprovação Final

Nome	Cargo/Função	Data	Assinatura
[Nome Completo]	Secretário de Governo Digital - MGI	____/____/2026	_____

Documento Controlado

- Versão: 2.0 (Equipe Enxuta)
- Data de Emissão: 13/02/2026
- Código do Documento: LIIA-PT-002/2026-v2
- Classificação: Público
- Validade: Até 16/06/2026
- Próxima Revisão: Mensal durante execução

Brasília/DF, 13 de Fevereiro de 2026
